

1. こどもの家における施設修繕等について

①中主第一・北野第一こどもの家における男子トイレの洋式化


中主第一・北野第一こどもの家の男子トイレにおいては、和式便器しかない状況であり、当該箇所以外は全て洋式化されていたことから、改修工事を行いました。

(工期：令和元年6月18日～令和元年9月20日)



②野洲第七こどもの家における駐車場の安全対策

野洲第七こどもの家の駐車場からの出庫については、歩道を交差しますが、近隣建物で見通しが悪く、減速等の安全対策を求められる状況であったことから、安全対策工事を行いました。(工期：令和31年4月25日～令和元年5月30日)

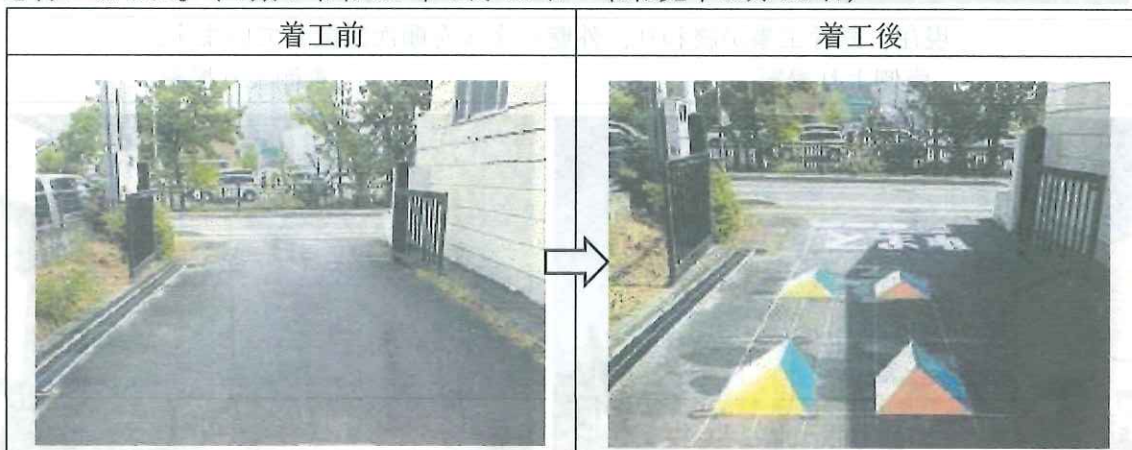


③その他

中主第二こどもの家にて、床板の一部が湿気を帯びて部分的にめくれている箇所があり、令和元年11月15日から22日にかけて修繕しました。

## 2. 篠原こどもの家増築工事について

篠原こどもの家においては、季節利用者を含めると利用定員の60名を超過する利用者数があるため、増築により25名の定員増を図ります。  
 (工期：令和元年5月29日～令和2年2月28日)

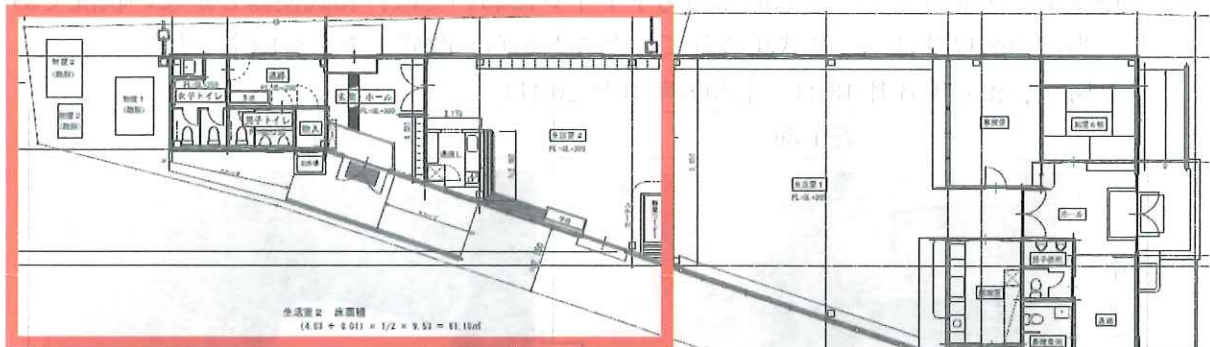

鉄骨造 平屋建て 98.29 m<sup>2</sup>  
 生活室1室 (湯沸しスペースを除いた面積 55.75 m<sup>2</sup>)  
 男女トイレ

撮影日：令和元年11月12日(火)

篠原こども園駐車場より撮影  
 ※右建物は既存の篠原こどもの家、後方に見える屋根は篠原小学校体育館



現在、鉄骨工事が終わり、外壁パネルを順次設置しています。

南側より撮影



東側より撮影



令和元年10月31日時点の進捗率 31%
